



Les travaux de rétablissement de la continuité écologique

CARACTERISTIQUES

- **Date** → Eté 2009




Ouvrage avant et après travaux

- **Objectifs** → Maintenir la continuité écologique des cours d'eau
- **Actions réalisées** → Démontage des superstructures de l'ouvrage.
- **Travaux complémentaires** → Installation de vannes factices
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Général du Pas-de-Calais (6,4%), SmageAa (43,6%)
- **Maître d'Oeuvre** → SmageAa
- **Entreprise** → APINOR (62)
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'ouvrage** → Sans objet

Fiche N° RCE-08-Moulin d'Assinghem

WAVRANS SUR L'Aa

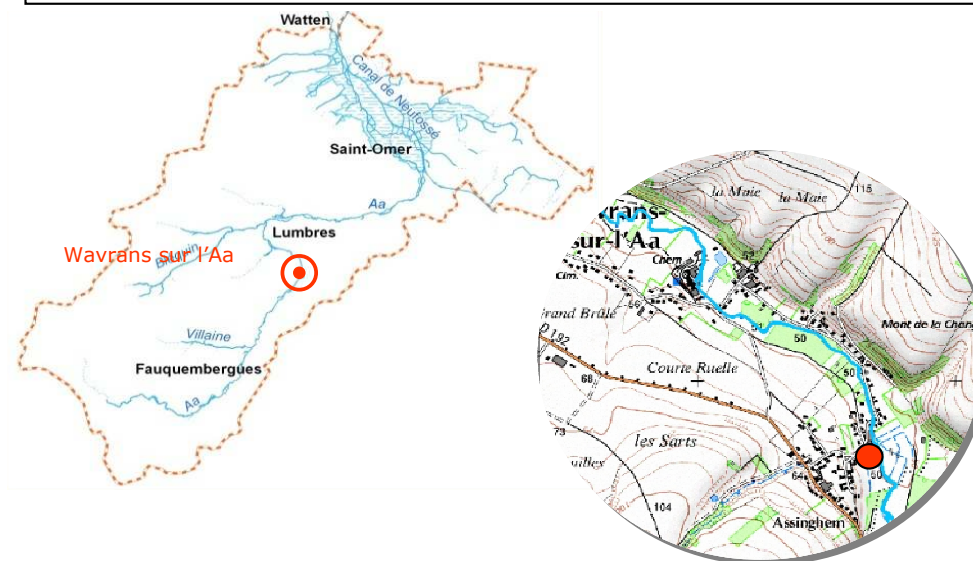

- **Ouvrage** → Moulin d'Assinghem – ROE34013
- **Commune** → Wavrans sur l'Aa (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Modification règlement d'eau** → AP 17/08/2009
- **Classement L-214-17** → Projet liste 1
- **Coût des travaux** → 5 987 €HT
- **Linéaire maintenu accessible** → 6000 m

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , SmageAactualités N°5 (2009) – 116 barrages en question ,
Notice d'évaluation de l'impact hydraulique des petits aménagements (2011-V2R Ingénierie & Environnement) , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)
 Documents téléchargeable sur smageaa.fr
