

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique

CARACTERISTIQUES

- **Date** → Automne 2018



Ouvrage avant et après travaux

- **Objectifs** → Restaurer la continuité écologique des cours d'eau
- **Actions réalisées** → arasement du seuil et recharge granulométrique.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (60%), Europe FEDER (40%)
- **Maitre d'Oeuvre** → SEGI(91)
- **Délégation maîtrise d'ouvrage** → SmageAa
- **Entreprise** → SARL DELBENDE (62)
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'ouvrage** → Sans objet

DOCUMENTATION


SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , SmageAactualités N°5 (2009) – 116 barrages en question ,

Notice d'évaluation de l'impact hydraulique des petits aménagements (2011-V2R Ingénierie & Environnement) , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

 Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Fiche N° **RCE-22- Moulin PRUDHOMME**

LUMBRES

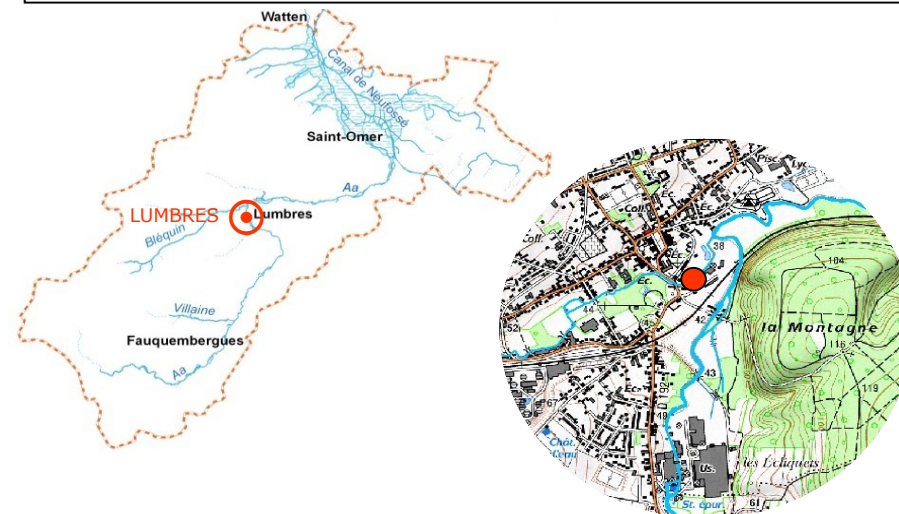

- **Ouvrage** → Moulin Prudhomme- ROE27386
- **Commune** → LUMBRES (62)
- **Cours d'eau** → Bléquin
- **Modification règlement d'eau** → AP 16/10/2018
- **Classement L-214-17** → Liste 2
- **Coût des travaux** → 32 000 € TTC
- **Linéaire rendu accessible** → 0,8 km
