

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique

Fiche N° RCE-25- Moulin de la Craionière

Ouve-Wirquin


CARACTERISTIQUES

- Date** → Eté 2019



Ouvrage avant et après travaux

- Objectifs** → Restaurer la continuité écologique des cours d'eau
- Actions réalisées** → Arasement du seuil, recharge granulométrique, pose d'une nouvelle passerelle.
- Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Europe FEDER (50%)
- Maître d'Oeuvre** → EURL AQUATEC (62)
- Délégation maîtrise d'ouvrage** → SmageAa
- Entreprise** → SARL DELBENDE (62)
- Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- Suivi de l'ouvrage** → Sans objet

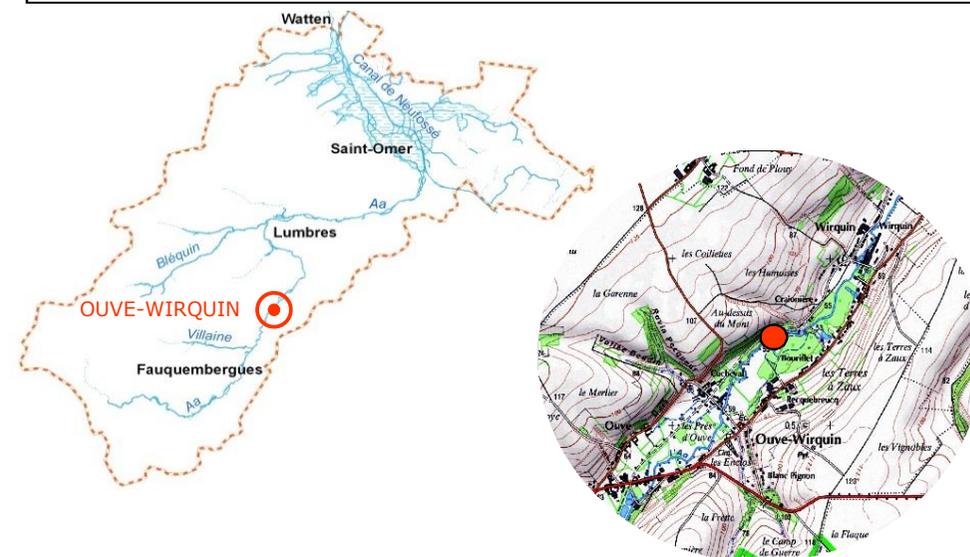

- Ouvrage** → Moulin de la Craionière – ROE34046
- Commune** → OUVE-WIRQUIN (62)
- Cours d'eau** → Aa
- Modification règlement d'eau** → AP 28/06/2019
- Classement L-214-17** → Liste 1
- Coût des travaux** → 70 000 € TTC
- Linéaire rendu accessible** → 1,5 km

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , SmageAactualités N°5 (2009) – 116 barrages en question ,
 Notice d'évaluation de l'impact hydraulique des petits aménagements (2011-V2R Ingénierie & Environnement) , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)
 Documents téléchargeables sur smageaa.fr
