


CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2012



Le site en 2010 et en 2012

- **Objectifs** → Restaurer et protéger les berges
- **Actions réalisées** → Protection de berges par fascinage, création de ripisylve, protection par clôture barbelé et pose d'une buvette.
- **Travaux complémentaires** → Abattage de 6 peupliers, retrait de l'atterrissement et décolmatage.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (10%), Propriétaire (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

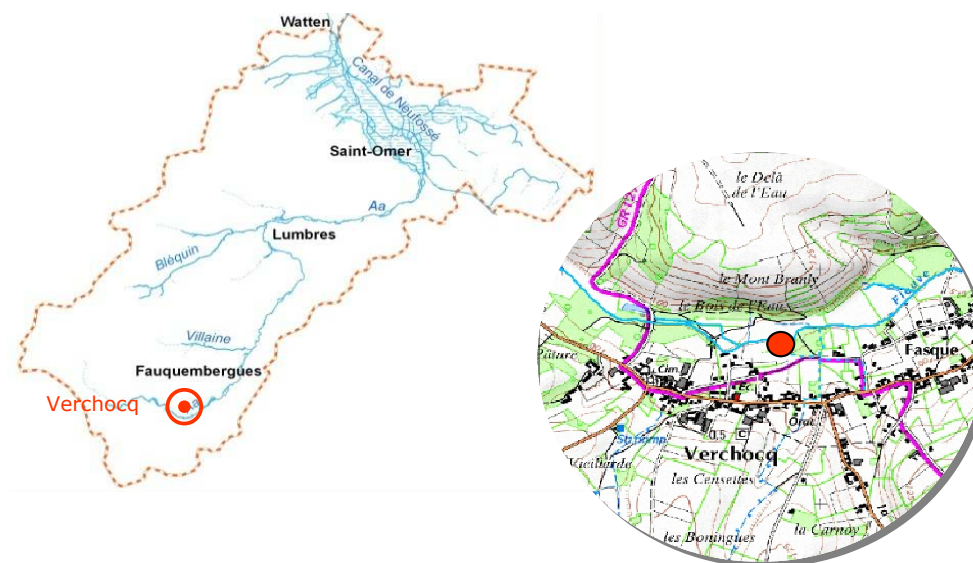

- **Commune** → Verchocq (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 2 900 € TTC
- **Linéaire aménagé** → 100 m
- **Linéaire planté** → 60 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.
- **Linéaire de clôture** → 85 m, 1 buvette posée
- **Protection de berges** → 15 m de fascinage de saule

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),
 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2012



Le site en 2010 et en 2012

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Création de ripisylve et protection par clôture barbelé.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (10%), Propriétaire (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de données actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents



- **Commune** → Verchocq (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 1 600 € TTC
- **Linéaire aménagé** → 125 m
- **Linéaire planté** → 15 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.
- **Linéaire de clôture** → 125 m

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),
 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2012



Le site en 2010 et en 2012

- **Objectifs** → Protéger les berges de l'Aa et de petits ruisseaux
- **Actions réalisées** → Complément de ripisylve et protection par clôture barbelée, et pose de buvettes .
- **Travaux complémentaires** → Protection des zones de sources, retrait d'un atterrissement et décolmatage.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), Propriétaire (10%), SmageAa (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de données actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations et fauche des chardons dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents



- **Commune** → Verchocq (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 6 150 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 800 m
- **Linéaire planté** → 35 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.
- **Linéaire de clôture** → 755 m, 2 buvettes posées
- **Protection de berges** → 40 m de fascinage de saule

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),
 Documents téléchargeable sur smageaa.fr


CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2012



Le site en 2010 et 2012

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Plantations de ripisylve, protection par clôture et mise en place d'abreuvoirs.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations et fauche des chardons dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

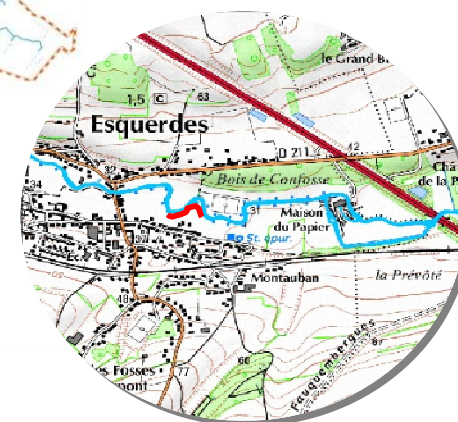

- **Commune** → Esquerdès (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 4 900 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 230 m
- **Linéaire planté** → 105 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.
- **Linéaire de clôture** → 215 m et 1 buvette posée
- **Protection de berges** → 15 m de fascinage de saule

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

 Documents téléchargeable sur smageaa.fr


CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2012



Le site en 2010 et 2012

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Création de ripisylve et protection par clôtures barbelées.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (20%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa Pas de suivi prévu
- **Evaluation écologique** → Pas de suivi prévu
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations et fauche des chardons dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

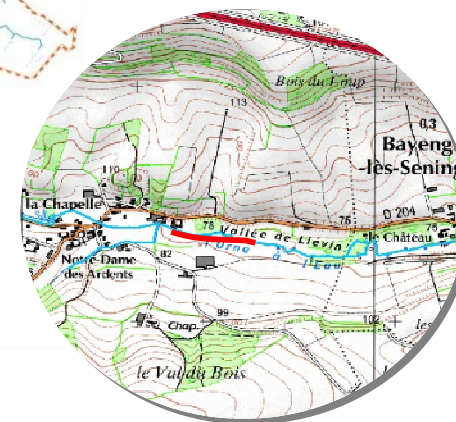

- **Commune** → Seninghem (62)
- **Cours d'eau** → Urne à l'eau
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 8 225 € TTC
- **Linéaire aménagé** → 430 m
- **Linéaire planté** → 308 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.
- **Linéaire de clôture** → 445 m

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),
 Documents téléchargeable sur smageaa.fr

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2012



Le site en 2010 et 2012

- **Objectifs** → Restaurer une berge communale
- **Actions réalisées** → Protection de berge, complément de ripisylve et protection par clôture barbelée, et pose de buvette .
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (10%), Propriétaire (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de donnée actuellement
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

Fiche N° RHA-26-Restauration de berges, plantations et clôtures BAYENGHEM LES SENINGHEM



- **Commune** → Bayenghem les Seninghem (62)
- **Cours d'eau** → Urne à l'eau
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 4 400 € TTC
- **Linéaire aménagé** → 160 m
- **Linéaire planté** → 50 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc, Erable sycomore.
- **Linéaire de clôture** → 95 m, 1 buvette posée
- **Protection de berges** → 22 m de fascinage de saule

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

 Documents téléchargeable sur smageaa.fr


CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2012



Le site en 2010 et 2012

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Plantations de ripisylve, protection par clôture et mise en place d'abreuvoirs.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (50%), Conseil Régional du Nord - Pas-de-Calais (30%), SmageAa (10%), Propriétaire (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Evaluation écologique** → Pas de suivi prévu
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations et fauche des chardons dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

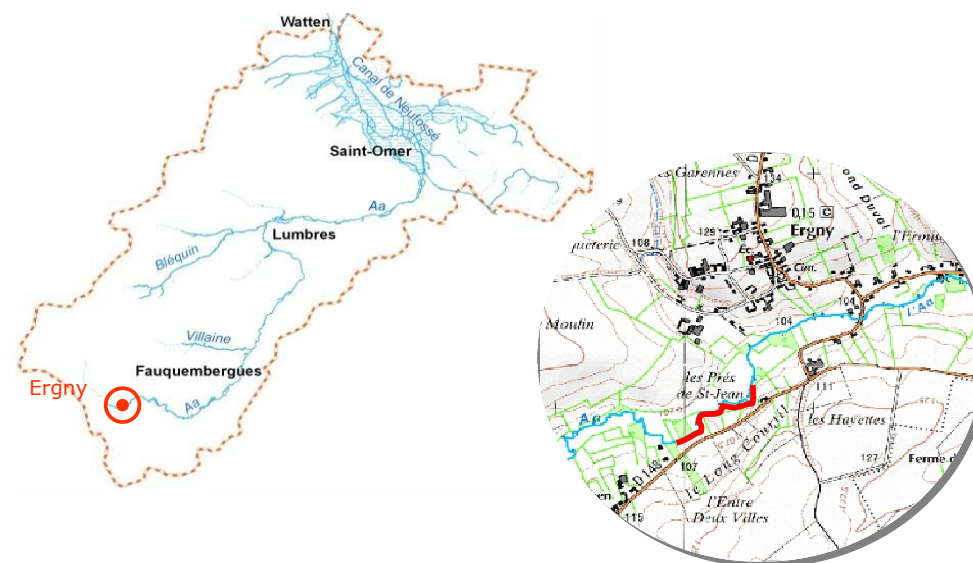

- **Commune** → Ergny (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 9 550 € TTC
- **Linéaire aménagé** → 940 m
- **Linéaire planté** → 75 m
- **Essences** → Viorne obier, Noisetier, Fusain d'Europe, Cornouiller sanguin, Symphorine, Prunellier, Saule marsault, Aulnes glutineux, Saule blanc.
- **Linéaire de clôture** → 755 m, 2 buvettes posées

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 , Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

 Documents téléchargeable sur smageaa.fr
