Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-57-Plantations et clôtures**

Merck-Saint-Liévin

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2017

Le site en 2015 et en 2017

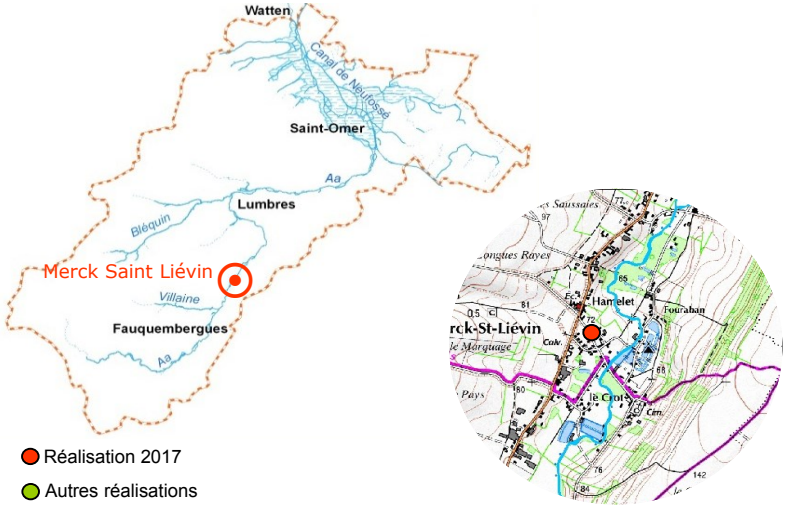

- **Objectifs** → Restaurer et protéger les berges
- **Actions réalisées** → Création de ripisylve, protection par clôture barbelée et pose d'une buvette.
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (70%), Conseil Régional des hauts de France (20%), SmageAa (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien des plantations dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

- **Commune** → Merck-Saint-Liévin (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 8 969,00 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 800 m
- **Linéaire planté**→ 70 m de fascinage de saule
- **Essences**→ Aulne glutineux et Saule blanc
- **Linéaire de clôture** → 768 m, 4 buvettes posées

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Mise à jour le 08/08/2017

Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-58- Pose de clôtures**

Bayenghem les Seninghem

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2017

Le site en 2017

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Protéger les berges par pose de clôtures
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (70%), Conseil Régional des Hauts-de-France (20%), SmageAa (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

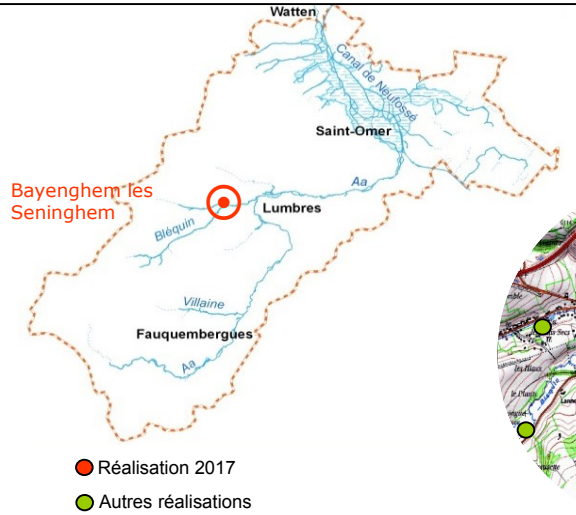

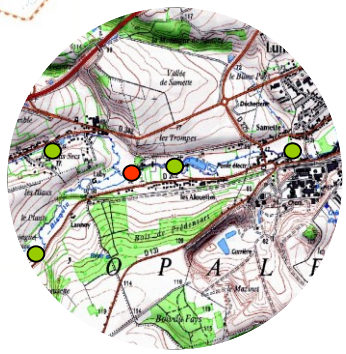

- **Commune** → Bayenghem les Seninghem (62)
- **Cours d'eau** → Bléquin
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 1 037 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 130 m
- **Linéaire e clôture** → 125m

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

🗐 Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Mise à jour le 08/08/2017

Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-59-Protection de berges**

Rumilly

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2017

Le site en 2016 et en 2017

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Restaurer et protéger les berges par fascinages et plantations d'hélophytes
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (70%), Conseil Régional des Hauts-de-France (20%), SmageAa (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

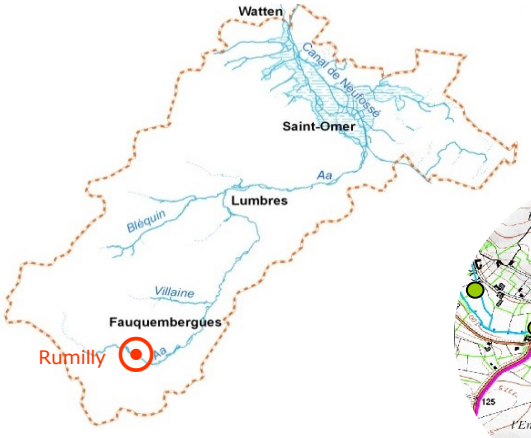

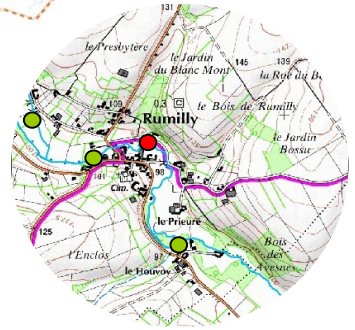

- **Commune** → Rumilly (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 3 088 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 20 m
- **Protection de berges** → 20 m de fascinage de saule

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006)

🗐 Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Mise à jour le 08/08/2017

Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-60-Protection de berges**

Bayenghem-les-Seninghem

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2017

Le site en 2016 et en 2017

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Protection de berges par fascinage
  Financement → Agence de l'eau Artois-Picardie (70%), Conseil Régional des Hauts-de-France (20%), SmageAa (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa Pas de suivi prévu
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

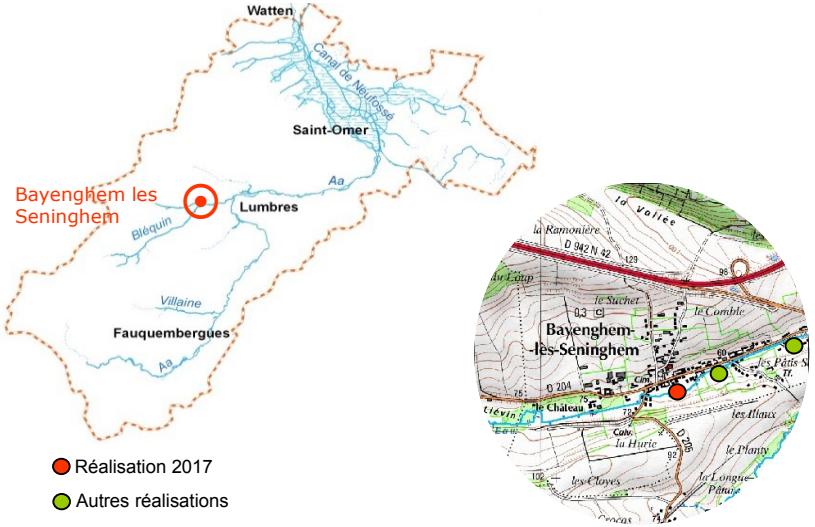

- **Commune** → Bayenghem-les-Seninghem (62)
- **Cours d'eau** → Bléquin
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 3 088 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 20 m
- **Protection de berges** → 20 m de fascinage de saule

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

🗐 Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Mise à jour | 08/08/2017

Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-61-Protection de berges**

Wicquinghem

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2017

Le site en 2016 et en 2017

- **Objectifs** → Protéger les berges
- **Actions réalisées** → Protection de berges par fascinage
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (70%), Conseil Régional des Hauts-de-France (20%), SmageAa (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

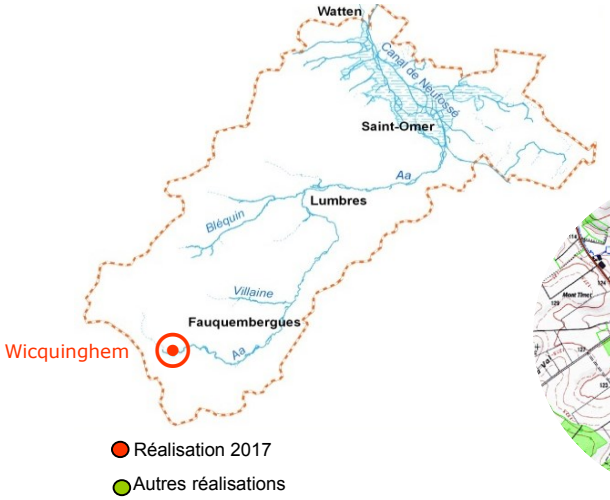

- **Commune** → Wicquinghem (62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 2 344 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 18 m
- **Protection de berges** → 18 m de fascinage de saule

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

🗐 Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Mise à jour le 08/08/2017

Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-62-Restauration de berges,**

Elnes

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Printemps 2017

Le site en 2016 et en 2017

- **Objectifs** → Restaurer et protéger les berges
- **Actions réalisées** → Protection de berges et talutage
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (70%), Conseil Régional des Hauts-de-France (20%), SmageAa (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

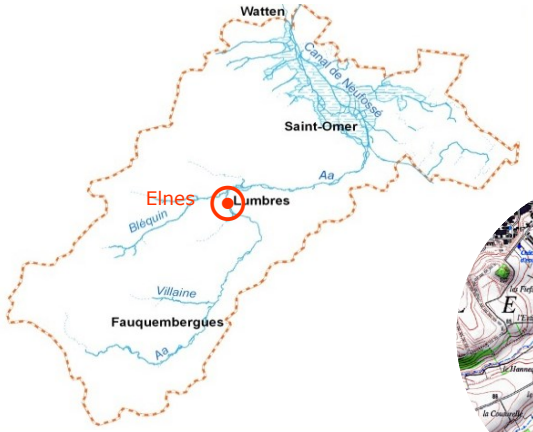

- **Commune** → Nielles les Bléquin (62)
- **Cours d'eau** → Bléquin
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 3 796 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 31 m
- **Protection de berges** → 31 m fascinage de saule

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

🗐 Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Mise à jour le 08/08/2017

Les travaux de restauration des habitats

Fiche N° **RHA-63-Diversification des écoulements**

Lumbres

CARACTERISTIQUES

- **Réalisation** → Automne 2017

Le site avant et après travaux

- **Objectifs** → Diversifier les écoulements pour améliorer le franchissement piscicole
- **Actions réalisées** → diversifier les écoulements par pose denroochements
- **Financement** → Agence de l'eau Artois-Picardie (70%), Conseil Régional des Hauts-de-France (20%), SmageAa (10%)
- **Entreprises** → Equipe rivière du SmageAa
- **Suivi de l'aménagement** → Entretien dans le cadre du Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents

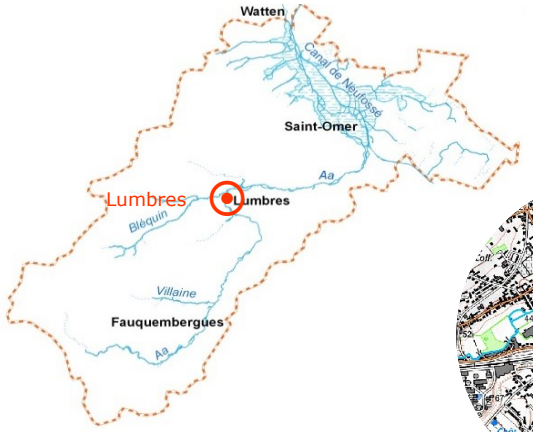

- **Commune** → Lumbres(62)
- **Cours d'eau** → Aa
- **Autorisation et DIG** → AP 16/11/2007
- **Coût des travaux** → 3 000 €TTC
- **Linéaire aménagé** → 25 m
- **Diversification écoulement** → **20** m pose de blocs

DOCUMENTATION

SmageAactualités N°3 (2008) – Objectif 2015 🗐, Plan de gestion de l'Aa et de ses affluents 2007-2016 (2006),

🗐 Documents téléchargeables sur smageaa.fr

Mise à jour le 08/10/2017
